

**Dodatek č. 2**

**Smlouva o dílo na akci: „Likvidace elektrického vedení“**

**Kód akce: A1462**

**č. ORS/Von/395/2020 + D2**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO  
DIČ

000 07 536  
CZ00007536

**Bankovní  
spojení:**

Komerční banka, a. s., pobočka  
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn.: AXVIII 433


**Číslo účtu:**



**Zastoupen:**

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:**

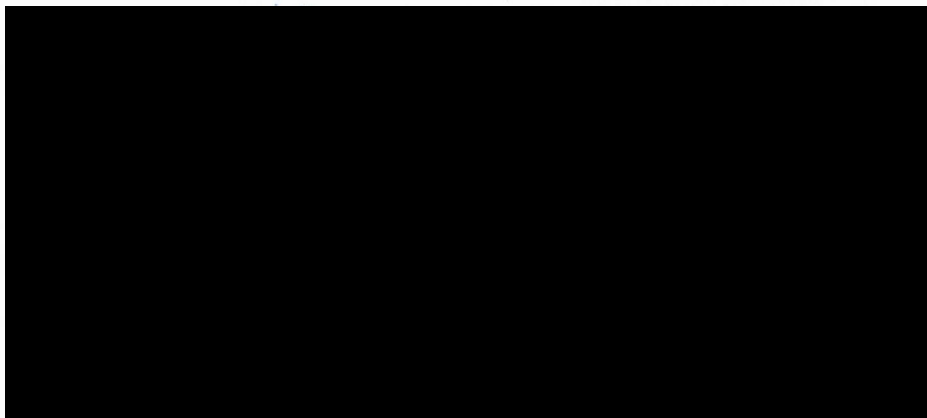

**Ve věcech obchodních:**

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**PROFFA s.r.o.**  
Dukelská 5417  
430 01 Chomutov

IČO  
DIČ

287 15 942  
CZ28715942

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.  
zn.: C 28272

**Číslo účtu:**



**Zastoupena:**

Pavlem Faiglem, jednatelem společnosti



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Likvidace elektrického vedení“, kód akce A1462, uzavřené dne 11. 12. 2020 pod č. Objednatele ORS/Von/395/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného od dne 18. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

## I. Důvod uzavření Dodatku č. 2

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna obsahové náplně jednotlivých etap realizace díla a s tím související změna textové části odst. 1 článku IV. „Termín dokončení a předání díla“, a to na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění díla.

Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je skutečnost, že Zhotovitel k odstranění ocelového stožáru OC7 a betonového sloupu č. 8 nemůže použít pro příjezd na pozemek č. 726/2 a p. č. 1711 v k. ú. Lom u Mostu přilehlou komunikaci, jak bylo původně plánováno. Terén je v takovém stavu, že neumožňuje příjezd těžké mechanizace, bez nutnosti vynaložení neúměrně vysokých nákladů na následnou úpravu terénu do předešlého stavu. Proto bylo rozhodnuto použít pro příjezd pozemky č. 705/1 a p. č. 705/8 v k. ú. Lom u Mostu, které jsou ve vlastnictví Agro Lišnice, s. r. o. Dle sdělení vlastníka však bude možné na tyto pozemky vjet těžkou mechanizací až v období od 9. 8. – 29. 8. 2021, tj. až po sklizni, případně před novým osetím pole.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů a s ohledem na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků při realizaci tohoto díla, dohodly, že termín pro plnění I. etapy realizace díla nebude z důvodu neprovedení odstranění ocelového stožáru OC7 a betonového sloupu č. 8 dále prodlužován, ale provedení těchto prací bude přesunuto do II. etapy, s termínem plnění od 9. 8. – 29. 8. 2021, který se nemění.

## II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. II. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Předmětem Smlouvy je odstranění stávajícího nadzemního vedení elektrické energie (VN) v celkové délce 2 525 m, včetně sloupů, stožárů a základových patek.

Celá trasa elektrického vedení obsahuje 3 ocelové vodiče, které jsou vždy napojeny v místě sloupů a stožárů. Betonové sloupy (15 kusů), jsou kruhové, železobetonové, zakončené ocelovými výložníky s keramickými izolátory pro uchycení vodičů. Sloupy jsou kotveny do betonových základových patek. Ocelové stožáry (18 kusů), jsou příhradové z ocelových válcovaných profilů a jsou uchyceny ke dvoustupňové betonové základové patce. Po odstranění betonových základů budou vzniklé jámy zasypany materiálem odpovídajícím využití daného pozemku.

Likvidaci sloupů a stožárů, včetně vlastního vedení, označených čísly 07-15 provede Zhotovitel, vzhledem k podmínkám vlastníka dotčených pozemků, výhradně v období od 9. – 29. 8. 2021.

Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací, viz článek III. této Smlouvy a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

### Termín dokončení a předání díla:

- a) **24 kusů sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu do 15. 1. 2021,**
- b) **9 sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu od 9. 8. do 29. 8. 2021 (jedná se o sloupy a stožáry č. 07 - 15).**


## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.


3. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne **21. 01. 2021**

V Chomutově dne



**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel podniku  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)



**Pavel Faigl**  
jednatel společnosti  
PROFFA s.r.o.  
(Zhotovitel)
